


Strategiskt samarbetsforum




2021-10-26

Agenda

- Återkoppling från föregående möte
- Status inför release
- Status validering
- Laget runt
- Nästa möte 23/11 kl 9-11

Återkoppling föregående möte




2021-10-26

Punkter från förra mötet

- Förskrivningskollen
- Planering för 2022 pågår
 - Roadmap, vidareutveckling, FHIR mm
- Servicefönster 27-28 november
 - Inkörningsperiod 2 veckor
- Kontinuitetsplaner

Status inför release och status extern validering 21.0

Pia Venäläinen, Mathias Erlandsson




2021-10-26

Tidplan externa valideringsaktiviteter inklusive produktionsverifiering

2021

2022


Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

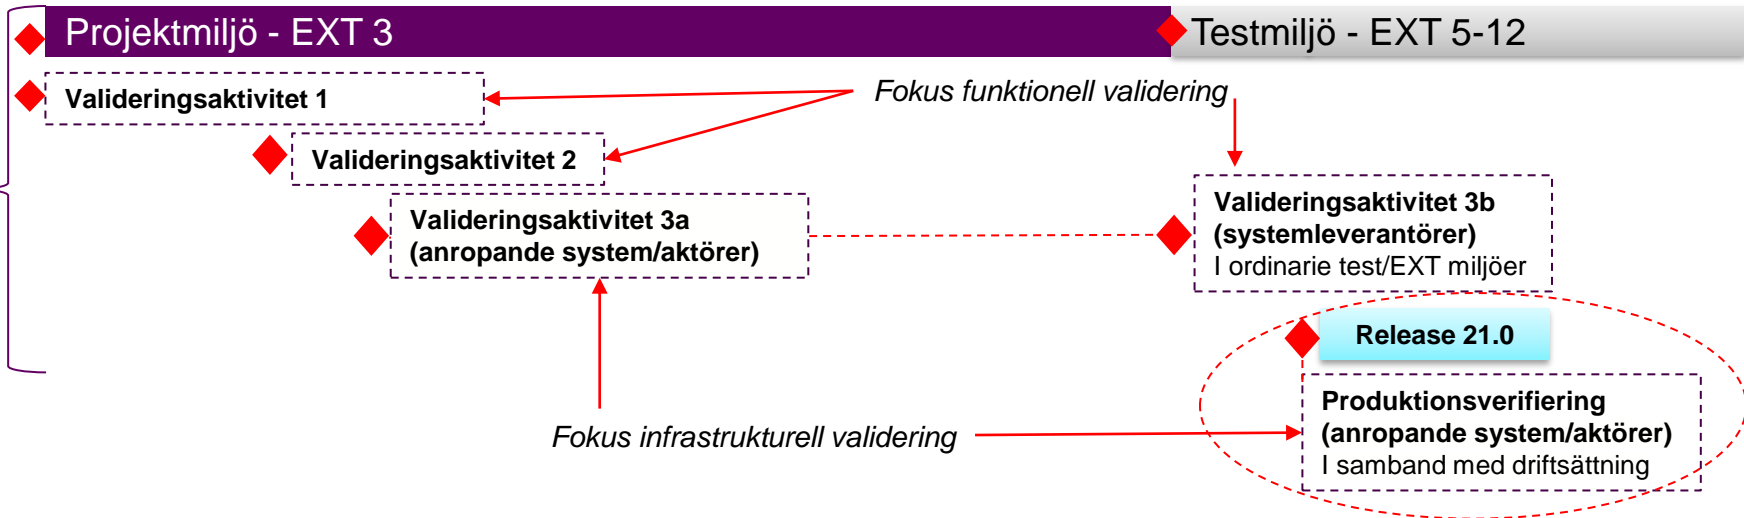 Befintliga tjänster
- transformatorn


Pågående aktiviteter

- Acceptanstester
- Systemintegrationstester
- Prestandatester
- Detaljplanering servicefönster

Releaseblock 21.0 – inklusive extern verifiering

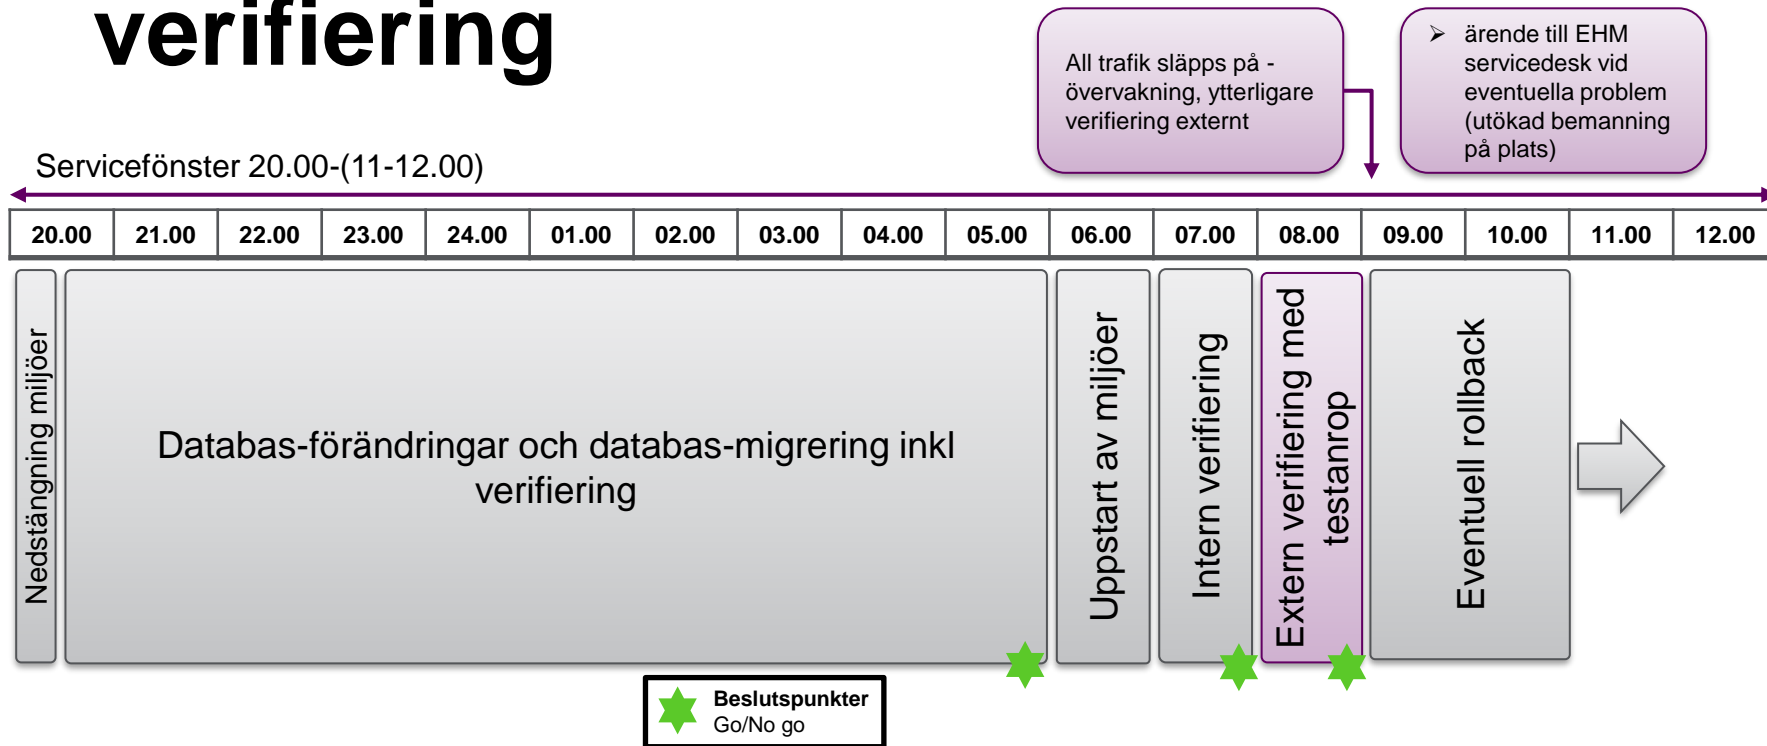

Tiden efter driftsättning

- Kommer ha utökade öppettider i vår Servicedesk tillsammans med resurser som kan felsöka och felrätta under 2 veckor.
- Problem hanteras av vår ordinarie incidentprocess som också är förstärkt.

Syfte och mål Produktionsverifiering

Verifiera i begränsad och kontrollerad form att befintliga integrationer mot E-hälsomyndighetens tjänsteplattform inte påverkas vid driftsättning av release 21.0.



Förutsättningar för deltagande

- Inför verifieringen ha dialog med E-hälsomyndigheten för att gemensamt planera genomförandet
- Kunna genomföra beskrivna verifieringar på testpatienter
- Anropen begränsas till endast det som ingår i verifieringen
 - Inga skarpa recept i blocket för extern verifiering
- Kontaktpersoner under själva aktiviteten – inklusive teknisk kompetens för eventuell felsökning

Om vi har ett stoppande fel ska vi kunna göra roll-back utan att ta hänsyn till uppdateringar som skett.

Status planering 211022

- Uppstartsmöte med regioner 13 oktober, med apotek 18 oktober
 - *Deltagare: 10 regioner och 2 systemleverantörer samt 1 apoteksaktör (2 apotekssystem)*


Intresseanmälningar från:

- ✓ 6 regioner (2 som fortsatt ska verifiera deltagande)
- ✓ 1 apoteksaktör med 2 bakomliggande system

Täcker genomförbart verifieringsbehov innan övrig produktionstrafik släpps på gällande infrastruktur, säkerhetslösning samt representerade system.

Kommunikation med deltagarna

- Gemensamma avstämningsmöten **inför** servicefönstret (v 45,46)
- Gemensamt incheckningsmöte **inför** servicefönster-helgen fredag vecka 47
- Kontakt med deltagarna genom teamsmöte + chatt **under** aktiviteten
- Samling i teamsmötet för gemensamt **avslut** av aktivitet
 - Information till aktörer att övrig trafik släpps på **alt**
 - Information om No go – då förlängs servicefönstret för att inkludera rollback




Laget runt



Laget runt

- Socialstyrelsen
- Läkemedelsverket
- Apoteksföreningen
- Läkarförbundet
- SKR
- Inera

Nästa möte



2021-09-14

Nästa möte

- Förslag 23/11, kl 09.00 – 11.00

Tack
